



COMUNE DI GENOVA


Genova, ottobre 2019

Gentilissimi/e,


Con piacere trovate nelle successive pagine il materiale informativo relativo alla sostituzione dell'impalcato del sovrappasso ferroviario Via Martiri della Libertà.

Come potrete vedere sono definiti nel dettaglio i lavori che verranno effettuati, le varie fasi di lavorazione e indicazioni su piani veicolari alternativi.

La Civica Amministrazione resta a Vostra disposizione per ogni evenienza.



Paola Bordilli
Assessore al Commercio
Grandi eventi e Valorizzazione Vallate




Pietro Piciocchi
Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici
Verde Pubblico

GENOVA
MORE THAN THIS

Sostituzione dell'impalcato del sovrappasso ferroviario ad uso stradale sito in via Martiri della Libertà a Genova Pegli

Prog. Km. 6+305 della linea ferroviaria
Ge Sampiedarena – Confine Francese

07 Ottobre 2019



RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE


INDICE

01	Sovrappasso ferroviario esistente	3
02	Lavori di costruzione nuovo sovrappasso – fasi lavorative	5
03	Piano veicolare alternativo	7
04	Aree di cantiere	9



Sovrappasso ferroviario esistente

Inquadramento fotografico

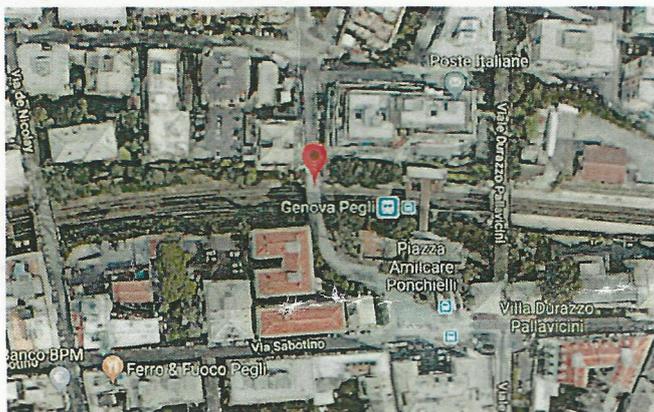

Vista satellitare e collocazione dell'opera



Vista del sovrappasso – sede stradale

Sovrappasso ferroviario esistente

Stato di conservazione

- **Avanzato degrado** delle strutture principali;
- **Forte ossidazione** delle strutture metalliche, in particolare in corrispondenza degli appoggi;
- **Riduzione della sezione resistente**;
- **Riduzione della portata utile dei ponte**;



Sostituzione del sovrappasso



Vista dell'impalcato

Lavori di costruzione del nuovo sovrappasso

Fasi di lavorazione e spazi interruttivi circolazione ferroviaria


Fasi di lavorazione

- Fase 01 – Predisposizione per spostamento sottoservizi a cura IRETI
- Fase 02 – Varo passerella pedonale provvisoria a cura RFI - necessaria sospensione circolazione ferroviaria dalle 21:00 del 16 Nov alle 09:00 del 17 Nov 2019 (12h)
- Fase 03 -- Spostamento sottoservizi su passerella pedonale a cura IRETI
- Fase 04 – Demolizione sovrappasso esistente a cura RFI – necessaria sospensione circolazione ferroviaria dalle 15 del 26 Dic alle 05 del 30 Dic 2019 (86h)
- Fase 05 – Consolidamento spalle e costruzione nuovi appoggi a cura RFI
- Fase 06 – Varo del nuovo sovrappasso a cura di RFI –necessaria sospensione circolazione ferroviaria (data in corso di valutazione)
- Fase 07 – Posizionamento sottoservizi, finiture e completamento a cura IRETI e RFI

Piano veicolare alternativo

Chiusura al traffico veicolare del sovrappasso dal 15 Ott 2019 al 31 Mag 2020


I percorsi utilizzati sono quelli già utilizzati da AMT ed AMIU. Non occorrono variazioni ai sensi di marcia. Saranno inseriti almeno tre cartelli di avviso di viabilità alternativa per la direzione monte.

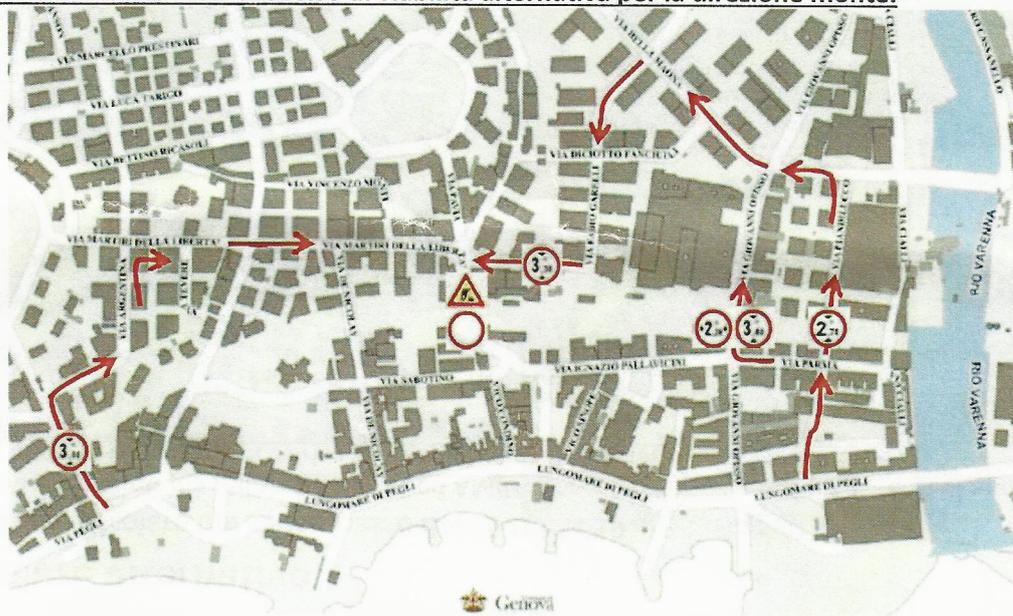

Piano veicolare alternativo

Chiusura al traffico veicolare del sovrappasso dal 15 Ott 2019 al 31 Mag 2020

I percorsi utilizzati sono quelli già utilizzati da AMT ed AMIU. Non occorrono variazioni ai sensi di marcia. Saranno inseriti almeno tre cartelli di avviso di viabilità alternativa per la direzione monte.

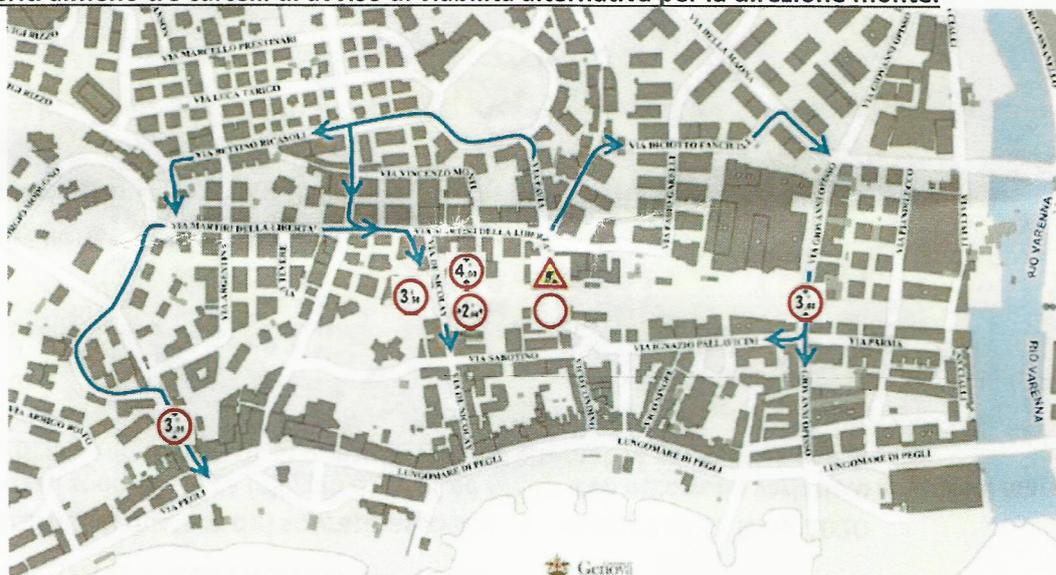

PERCORSI VEICOLARI ALTERNATIVI DALLE ALTURE DI PEGLI VERSO IL LUNGOMARE (SS1)




Sostituzione dell'impalcato del sovrappasso ferroviario ad uso stradale sito in via Martiri della Libertà a Genova Pegli

07/10/2019

Fase 01

Predisposizione per spostamento sottoservizi

- Chiusura al traffico veicolare
- Garantito il transito pedonale su entrambi i lati della via

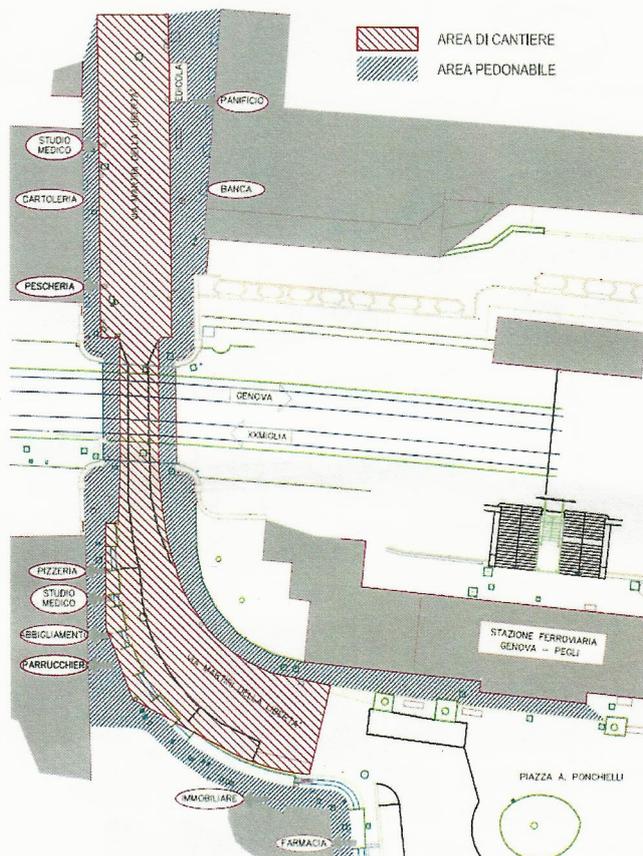


07/10/2019
Genova Pegli

Fase 02

Varo passerella metallica provvisoria

- Chiusura traffico veicolare ed al transito pedonale per ragioni di sicurezza

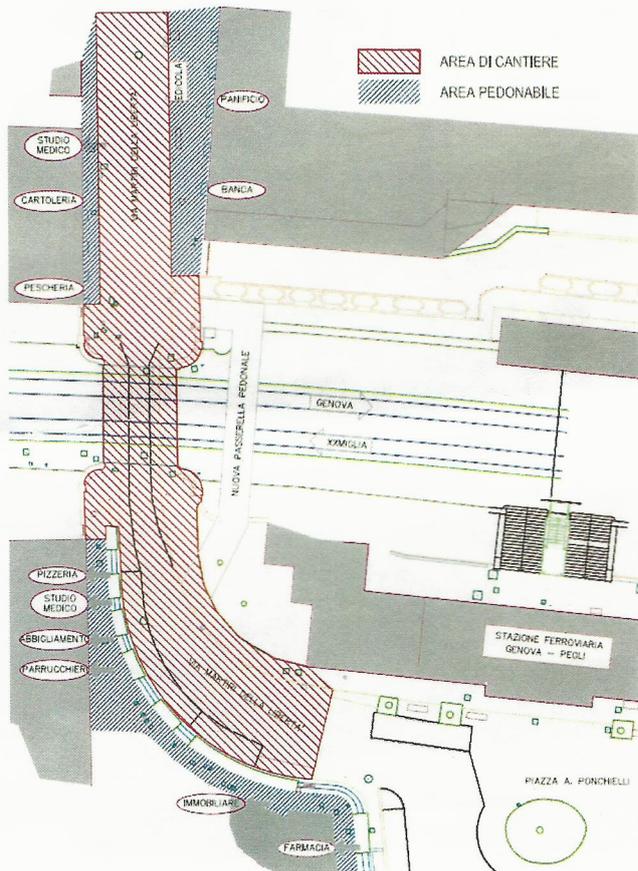


07/10/2019
Genova Pegli

Fase 03

Spostamento sottoservizi su passerella pedonale

- Chiusura al traffico veicolare
- Garantito il transito pedonale sul lato di levante del sovrappasso

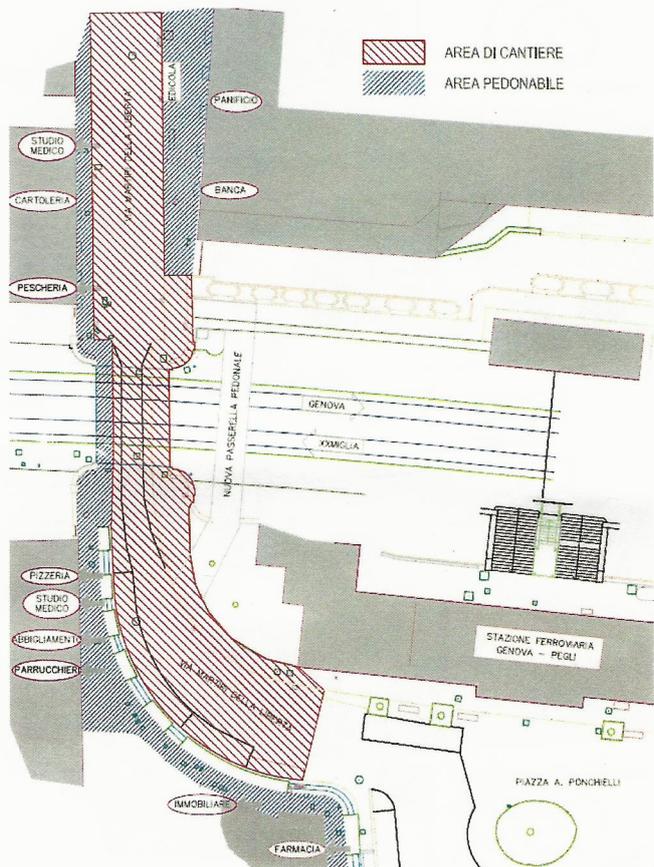


07/10/2019
Genova Pegli

Fase 06

Varo del nuovo sovrappasso

- Chiusura traffico veicolare ed al transito pedonale per ragioni di sicurezza

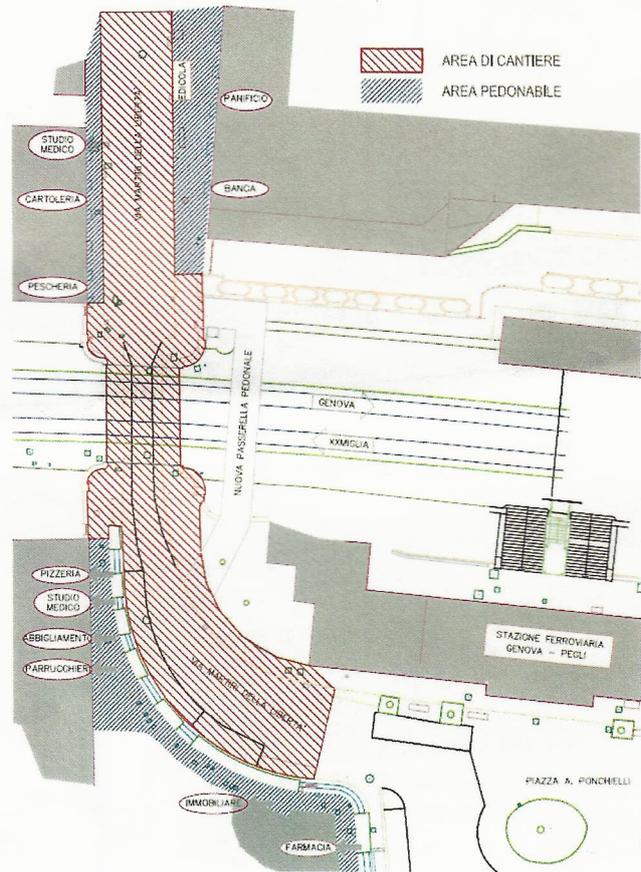


07/10/2019
Genova Pegli

13

Fase 07

Posizionamento sottoservizi, finiture e completamento

- Chiusura traffico veicolare
- Transito pedonale garantito per mezzo della nuova passerella
- Previsto attraversamento di via Martiri della Libertà per garantire l'accesso ai locali commerciali

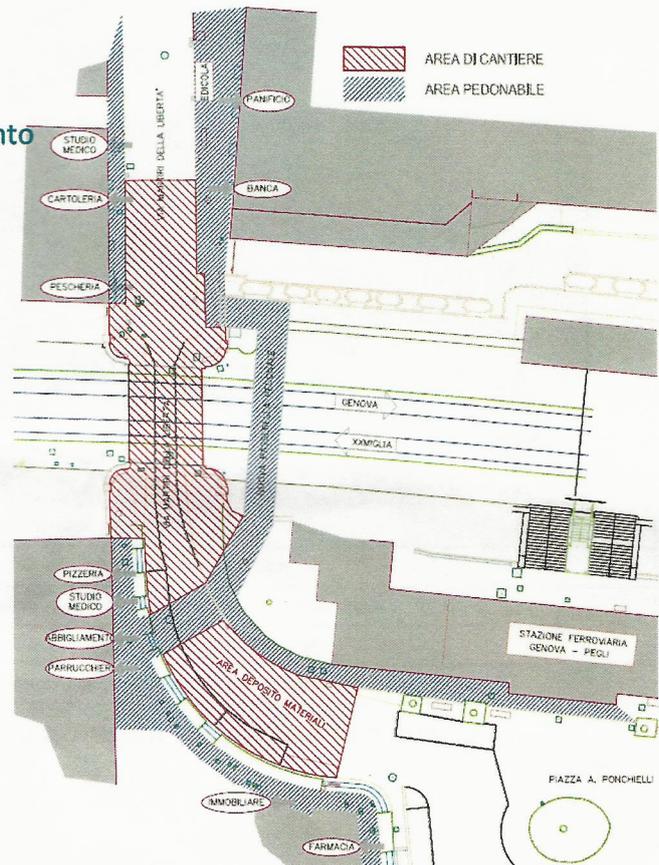


07/10/2019
Genova Pegli

14

Aree di cantiere

Parcheggio adiacente alla Stazione di Genova Pegli – chiusura dal 15/10/19 fino a fine lavori

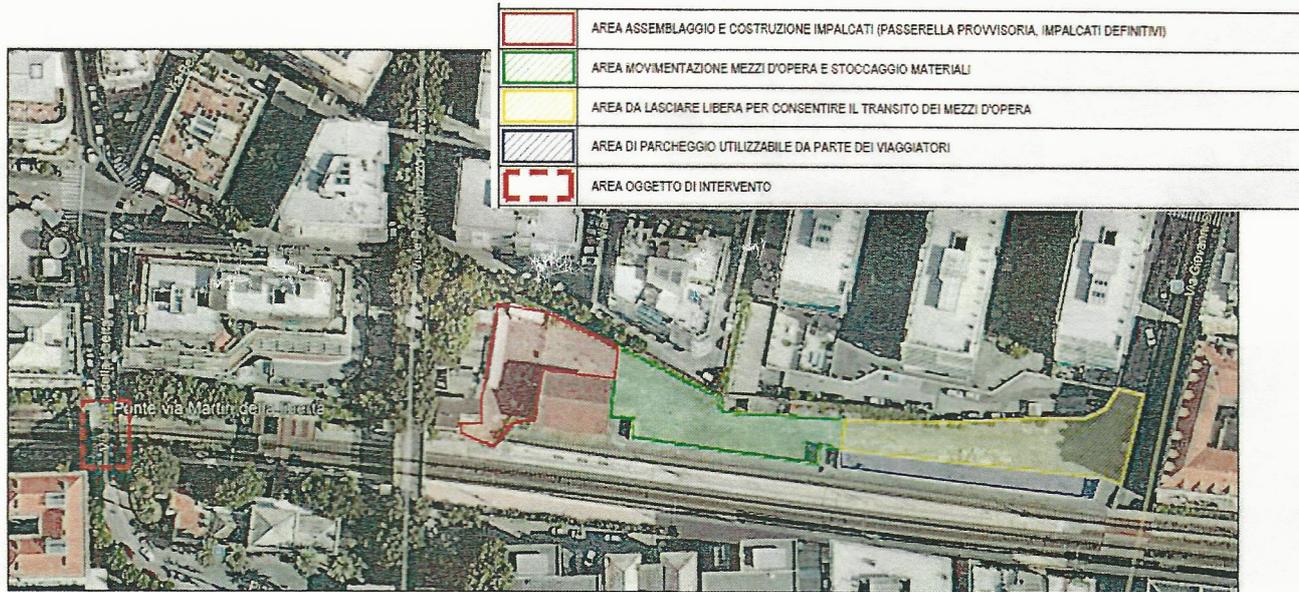

Grazie

